

## 21\_185\_OA\_02 Aumento De Capacidad Línea 2x220KV Encuentro – Kimal

[illegible]

Mes Reportado	09-2025
Adjudicatario EPC	Elecnor Chile
Fecha Dec. Adjudicación	02-03-2023
Plazo [Meses]	34
Fecha PeS/ EO Decreto	02-09-2025
Fecha PeS/ EO (Rev2)	15-12-2025
NUP del Proyecto	3883

Atraso Leve
A Tiempo


-5%
+5%

Atrasado
Adelantado

0,4%

Salud del Proyecto

<u>Estado Hitos Intermedios</u>									
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	

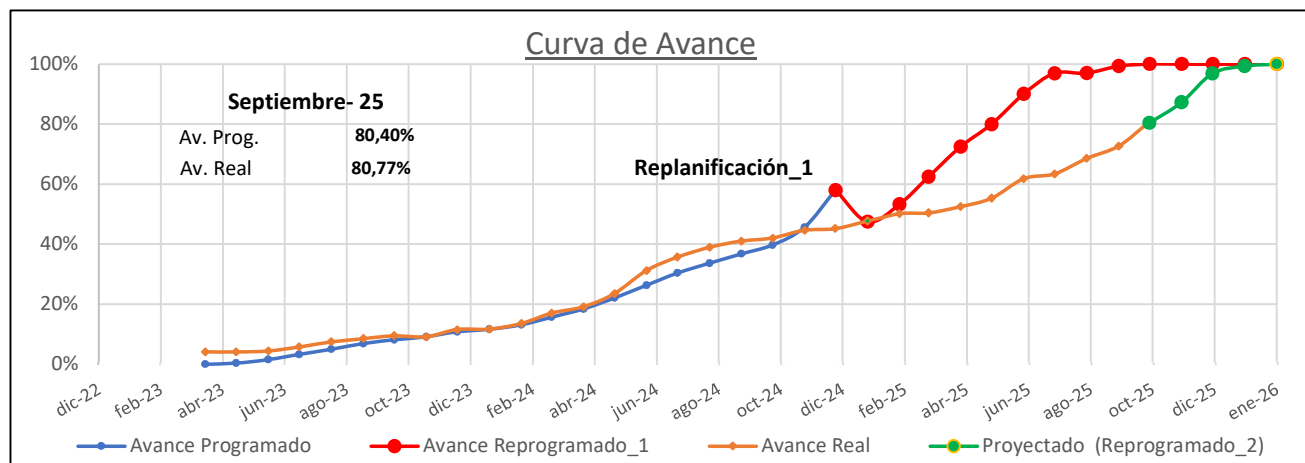

Principales Hechos del Período:

- Energización de paño J2.

Principales Riesgos a Mitigar:

- Otorgamiento en plazo de las desconexiones de línea 2x220 kV Encuentro – Kimal
