


# INFORME FOTOGRÁFICO TRABAJO DE PODA, TALA Y ROCE

Folio.	00/ 2024
Fecha de ejecución.	19 de noviembre 2024
Instalación.	LAT 66KV Parral San Gregorio
Sector y Comuna.	Parral, Maule
Inspector CGE.	Williams Franco Medina
Metros lineales Podados.	30
Metros lineales Rozados.	-
Metros lineales Talados.	-
Número de árboles podados.	-
Número de árboles talados.	-
Retiro de Camión con Ramas	2
OC	-
Solicitud CEN	2024117801

Hora Llegada a instalaciones	08:00 Hrs.	Hora de retiro instalaciones	17:20 Hrs.
Personal (BL): 1 jefe de Faena, 2 motosierristas, 1 ayudante, 1 operador de camión Grúa			
Vigencia	Bloqueo a la Reconexión	Hora entrega vigencia:	9:40 Hrs.

Estructuras Inicial Final		Intervención realizada	Metro lineal	N° Flexia pp	N° Flexia pp	Número árboles	M², u Otro	Ancho Faja seg. Inicial Final		Observaciones
311	312	Poda de árboles	30	FH-T-L0000000 19062V1	FRH-T-L0000000 12364V10	-	25	3	10	Poda de Árboles 100% Realizado

Aprobaciones		
 Luis Navarrete Vásquez RUT: 17.717.381-9		
Supervisor Contratista, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones CGE, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones Contratistas, Nombre, Rut y firma.

**Registro Fotográfico**  
**FOTOGRAFÍAS**



**VANO 311 ANTES**



**VANO 311 DURANTE**




**VANO 311 DURANTE**



**VANO 311 DURANTE**



FOTOGRAFÍAS

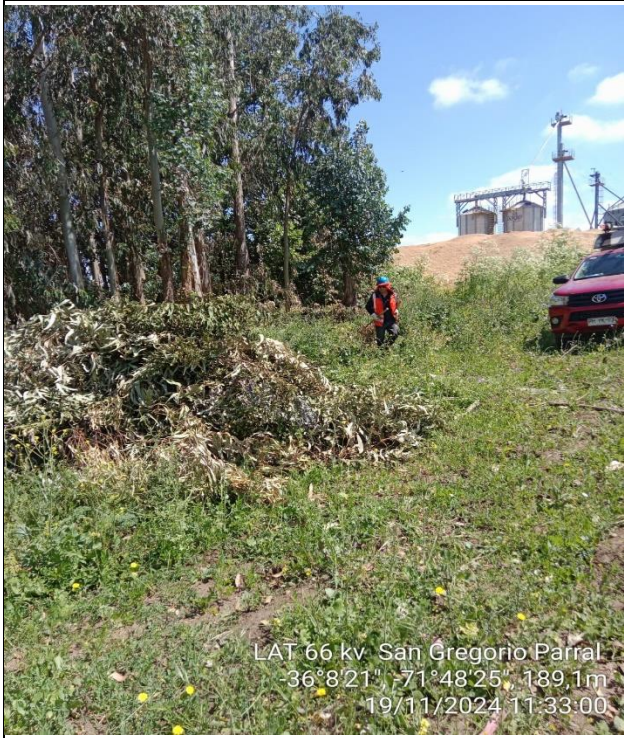

VANO 311 DURANTE

VANO 311 DURANTE



VANO 311 DURANTE

VANO 311 DESPUES
