


INFORME FOTOGRÁFICO TRABAJO DE PODA, TALA Y ROCE

Folio.	00/ 2024
Fecha de ejecución.	28 de octubre del 2024
Instalación.	LAT 66KV Parral San Gregorio
Sector y Comuna.	Parral, Maule
Inspector CGE.	Williams Franco Medina
Metros lineales Podados.	130
Metros lineales Rozados.	-
Metros lineales Talados.	-
Número de árboles podados.	-
Número de árboles talados.	-
Retiro de Camión con Ramas	-
OC	-
Solicitud CEN	2024109715

Hora llegada a instalaciones	08:00 Hrs.	Hora de retiro instalaciones	17:28 Hrs.
Personal (BL): 1 jefe de Faena, 2 Motosierristas, 1 ayudante.			
Vigencia	Bloqueo a la Reconexión	Hora entrega vigencia:	09:58 Hrs.

Estructuras Inicial Final		Intervención realizada	Metro lineal	N° Flexiapp	N° Flexiapp	Número árboles	M², u Otro	Ancho Faja seg. Inicial Final		Observaciones
311	312	Poda de árboles	130	FH-T-L0000000 19062V1	FRH-T-L0000000 11993V10	-	260	3	10	Poda de árboles 100% Realizado


Aprobaciones		
 Luis Navarrete Vásquez RUT: 17.717.381-9		
Supervisor Contratista, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones CGE, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones Contratistas, Nombre, Rut y firma.

Registro Fotográfico
FOTOGRAFÍAS



VANO 311 ANTES

VANO 311 DURANTE

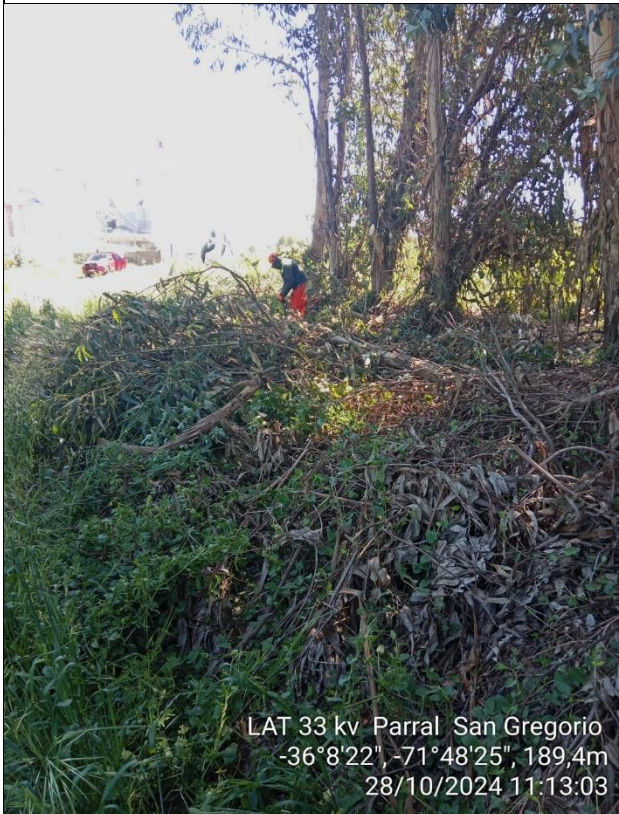

VANO 311 DURANTE

VANO 311 DESPUES
