



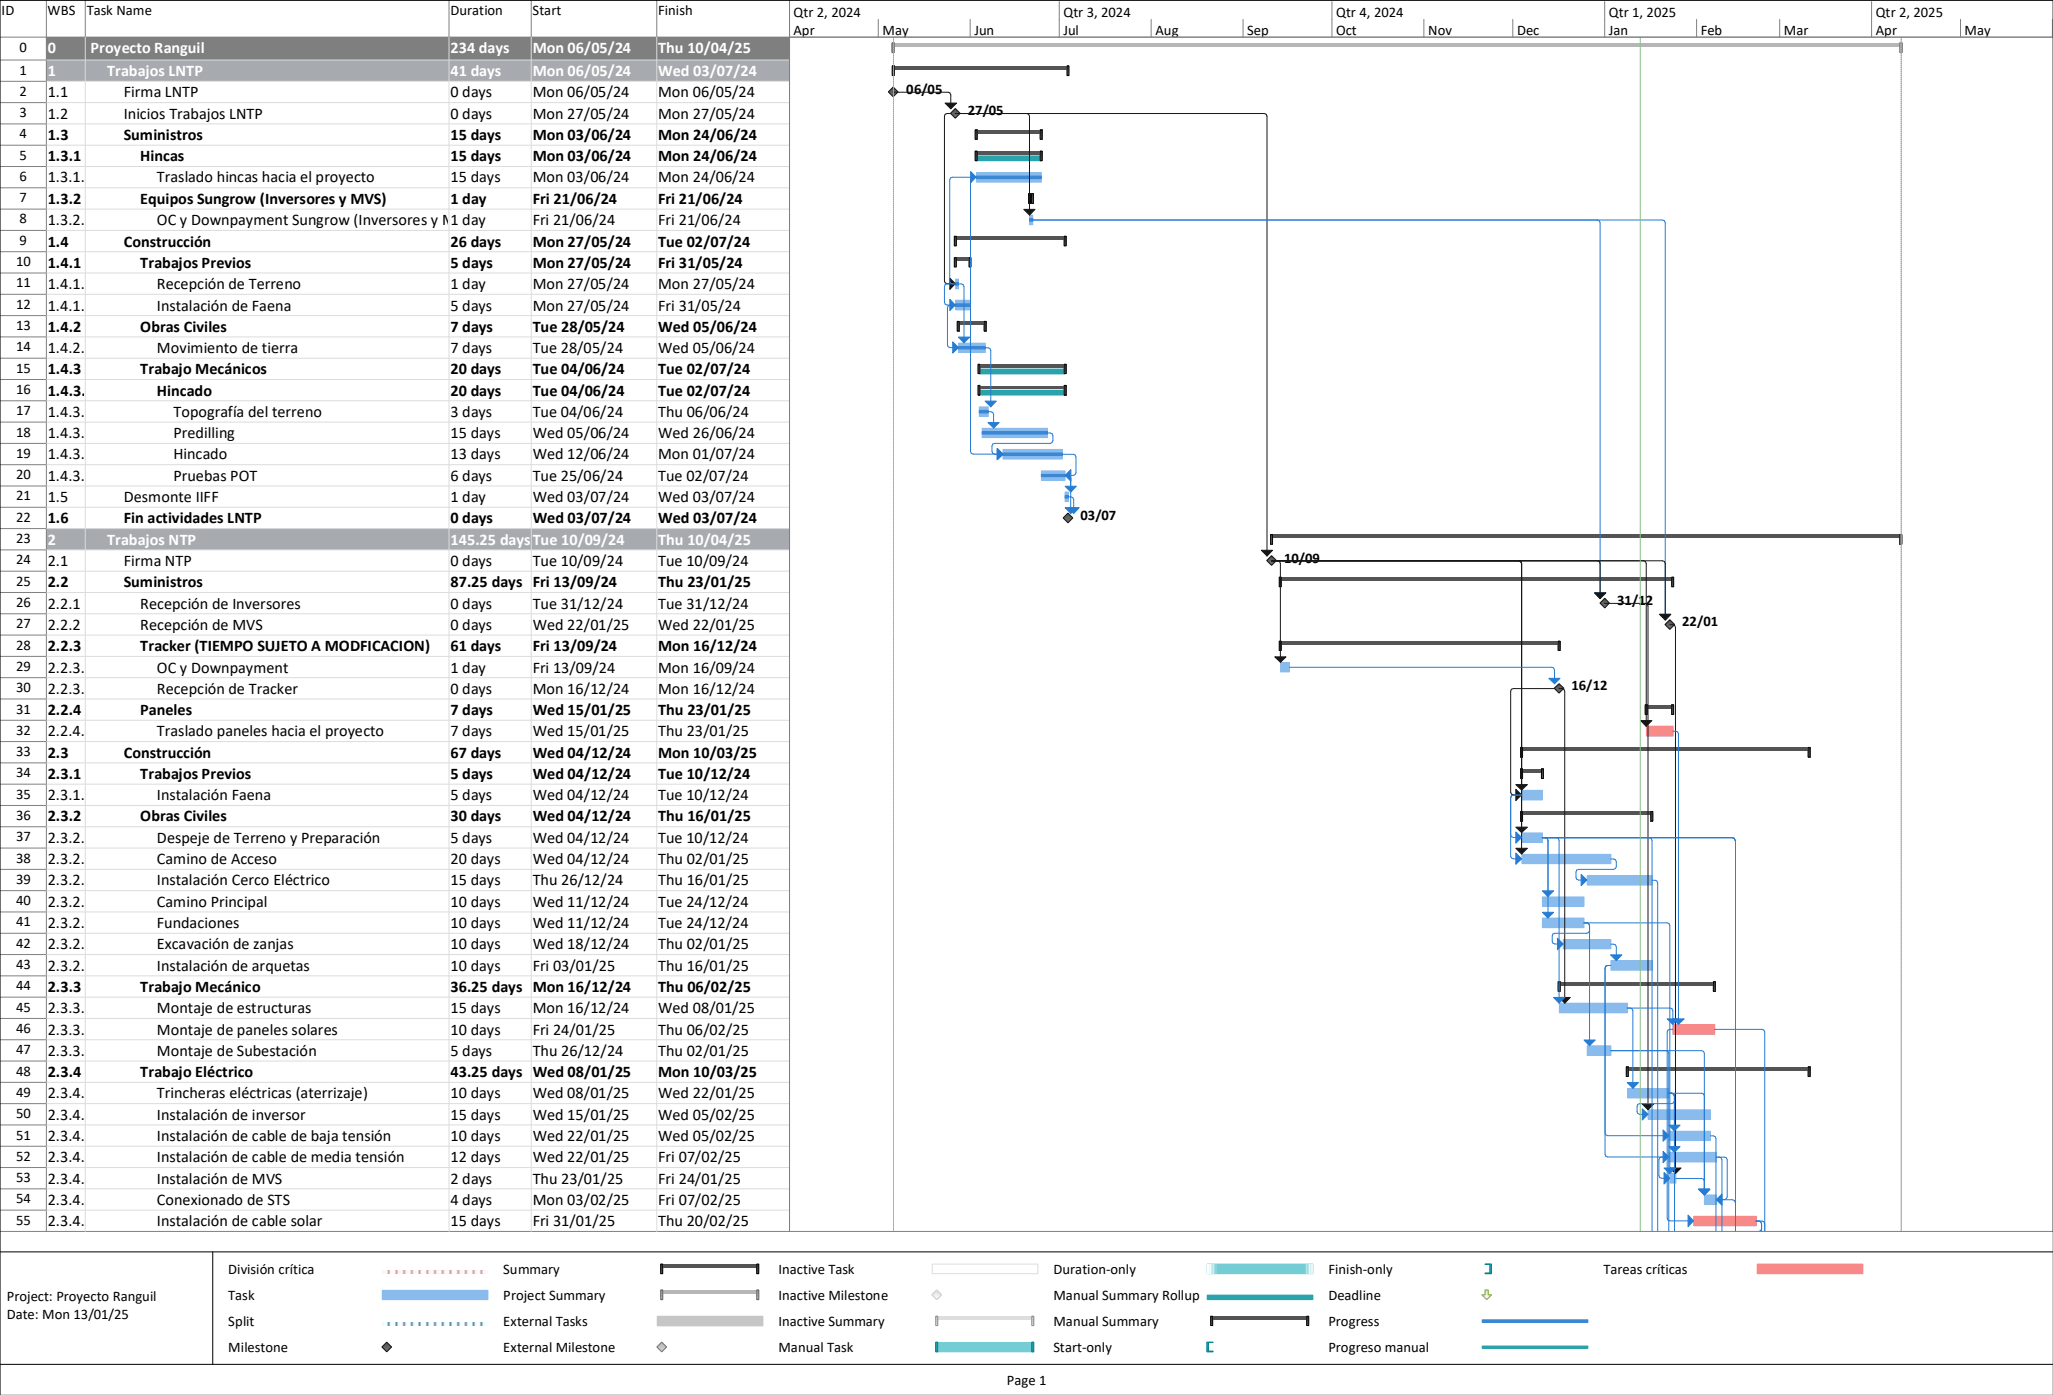

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025	
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
56	2.3.4.	Trabajo en Punto de Conexión (Pol)	10 days	Fri 14/02/25	Thu 27/02/25														
57	2.3.4.	Instalación tramo Subterráneo	10 days	Fri 14/02/25	Thu 27/02/25														
58	2.3.4.	Instalación tramo Aéreo	10 days	Fri 14/02/25	Thu 27/02/25														
59	2.3.4.	Conjunto empalme eléctrico	10 days	Fri 14/02/25	Thu 27/02/25														
60	2.3.4.	Sistema de Comunicación	37 days	Fri 17/01/25	Mon 10/03/25														
61	2.3.4.	Sistema CCTV	15 days	Fri 17/01/25	Thu 06/02/25														
62	2.3.4.	Instalación de cable de fibra óptica	15 days	Wed 22/01/25	Wed 12/02/25														
63	2.3.4.	Sensores y estación meteorológica	11 days	Fri 07/02/25	Fri 21/02/25														
64	2.3.4.	Integración SCADA	11 days	Mon 24/02/25	Mon 10/03/25														
65	2.4	Comisionamiento	56.25 days	Wed 22/01/25	Thu 10/04/25														
66	2.4.1	Comisionamiento en frío	36.25 days	Wed 22/01/25	Thu 13/03/25														
67	2.4.1.	Pruebas CC	15 days	Fri 21/02/25	Thu 13/03/25														
68	2.4.1.	Pruebas AC BT	10 days	Wed 05/02/25	Wed 19/02/25														
69	2.4.1.	Pruebas AC MT	10 days	Fri 07/02/25	Fri 21/02/25														
70	2.4.1.	Pruebas OTDR	5 days	Wed 12/02/25	Wed 19/02/25														
71	2.4.1.	Pruebas PAT	10 days	Wed 22/01/25	Wed 05/02/25														
72	2.4.1.	Comisionamiento de tracker	5 days	Mon 24/02/25	Fri 28/02/25														
73	2.4.2	Cierre de Proyecto	20 days	Thu 13/03/25	Thu 10/04/25														
74	2.4.2.	TAC	0 days	Thu 13/03/25	Thu 13/03/25														
75	2.4.2.	Comisionamiento caliente	15 days	Fri 14/03/25	Thu 03/04/25														
76	2.4.2.	Entrada en Operación Comercial	15 days	Fri 21/03/25	Thu 10/04/25														
77	2.4.2.	Presentación PAC a Mandante	0 days	Thu 10/04/25	Thu 10/04/25														

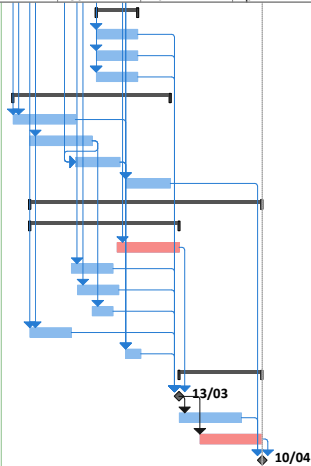

Project: Proyecto Ranguil
Date: Mon 13/01/25

División crítica

Task

Split

Milestone

.....

.....

.....

◆

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

▬

▬

▬

◆

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

▬

▬

▬

▬

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

▬

▬

▬

▬

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

▬

▬

▬

▬

Tareas críticas

▬
