

Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo


		AÑO/MES		2025											
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)	01-09-2025	17-10-2025									X	X		
B	Información Técnica para Estudios (IT-E)	01-09-2025	17-10-2025									X	X		
C	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP)														
D	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones	20-10-2025	07-11-2025										X	X	
E	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out														
F	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios	20-10-2025	24-10-2025										X		
G	Esquema de Medidas de Energía (EME)	20-10-2025	24-10-2025										X		
H	Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)	03-11-2025	07-11-2025											X	
I	Pruebas end to end (Teleprotecciones)														
J	Puesta en Servicio estimada (Día/Mes/Año)	27-11-2025	30-11-2025											X	
K	Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles)	01-12-2025	05-12-2025												X

Dependiendo del tipo de proyecto las **actividades C, D, E, F, G, H e I** pueden no ser solicitadas.

La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.

Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.

Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.

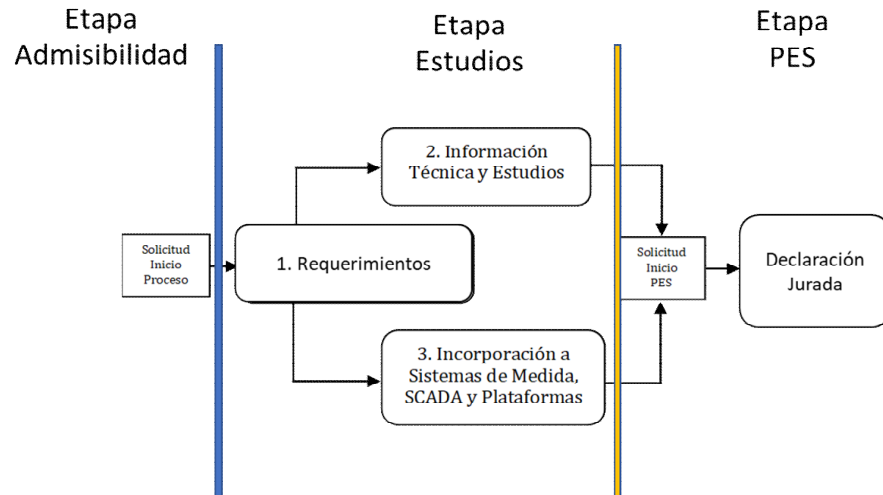

El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.
